Horton
ARCHITECTURAL DEPARTMENT

Katerina 3 6x6 + terrace (podłoże z bloczków)

L

płyta OSB (2,5x1,2m) – 12 szt. ilość bloczków – 63 szt.

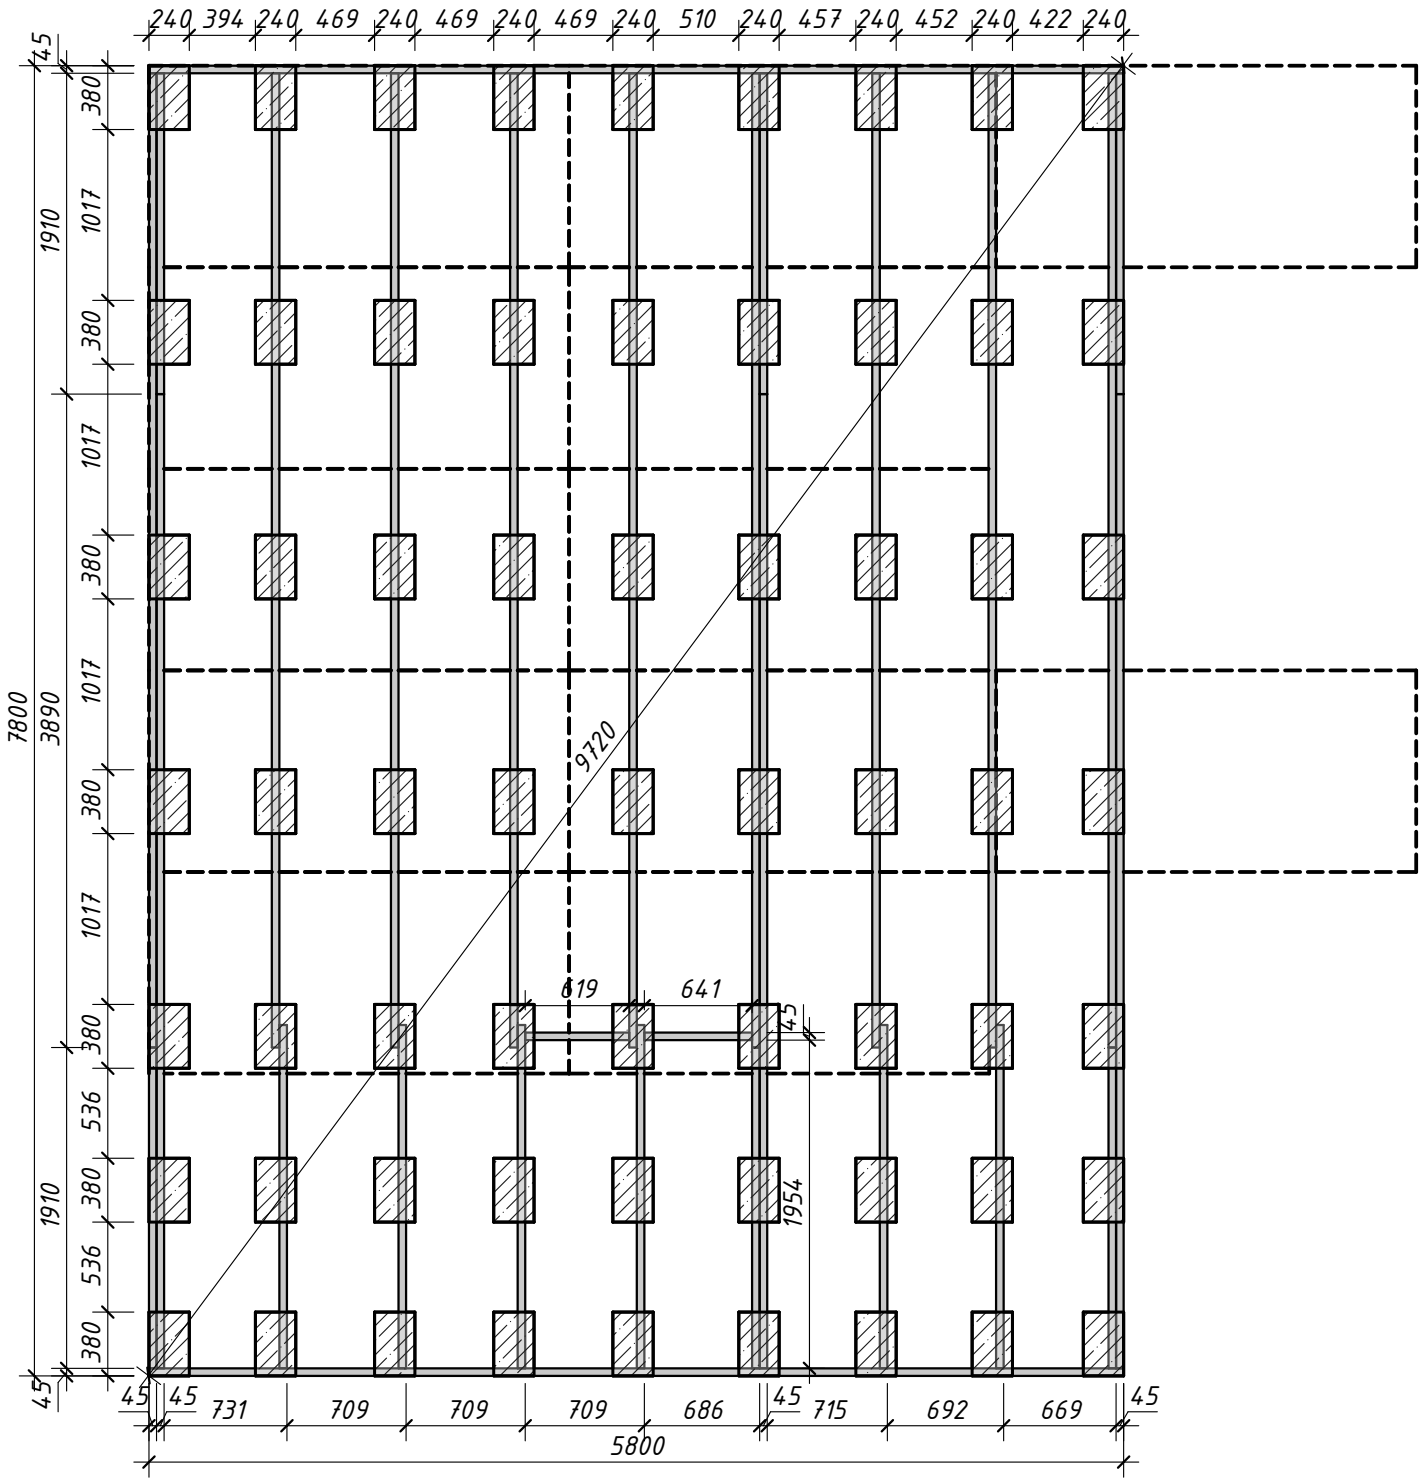

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA FUNDAMENTU POD FUNDAMENT Z BLOCZKÓW: (WYKONYWANE PRZEZ KLIENTA).

- Wykopać ok. 20-25 cm powierzchni wg schematu rozmieszczenia bloczków.
- Wsypać warstwę piachu około 7 cm- zagęścić zagęszczarką
- Położyć geowłókninę i przysypać ją kilkucentymetrową warstwą piachu
- Następnie wysypać kolejną warstwę piachu
- Wysypać tłuczeń o frakcji 0-31mm lub 16-31mm około 15cm (w zależności od głębokości wykopu)
- Zagęścić zagęszczarką.

OPIS I ZAKRES PRAC (WYKONUJE HORTON):

- Usunięcie darni i wykopanie miejsc pod bloczki (zgodnie z rysunkiem ułożenia bloczków)
- Montaż bloczków na suchej zaprawie cementowej, wypoziomowanie ich w pionie

HORTON
dział architektoniczny
