Raquel (podłoże z bloczków)

L

płyta OSB (2,5x1,2m) – 7 szt.

ilość bloczków – 36 szt.

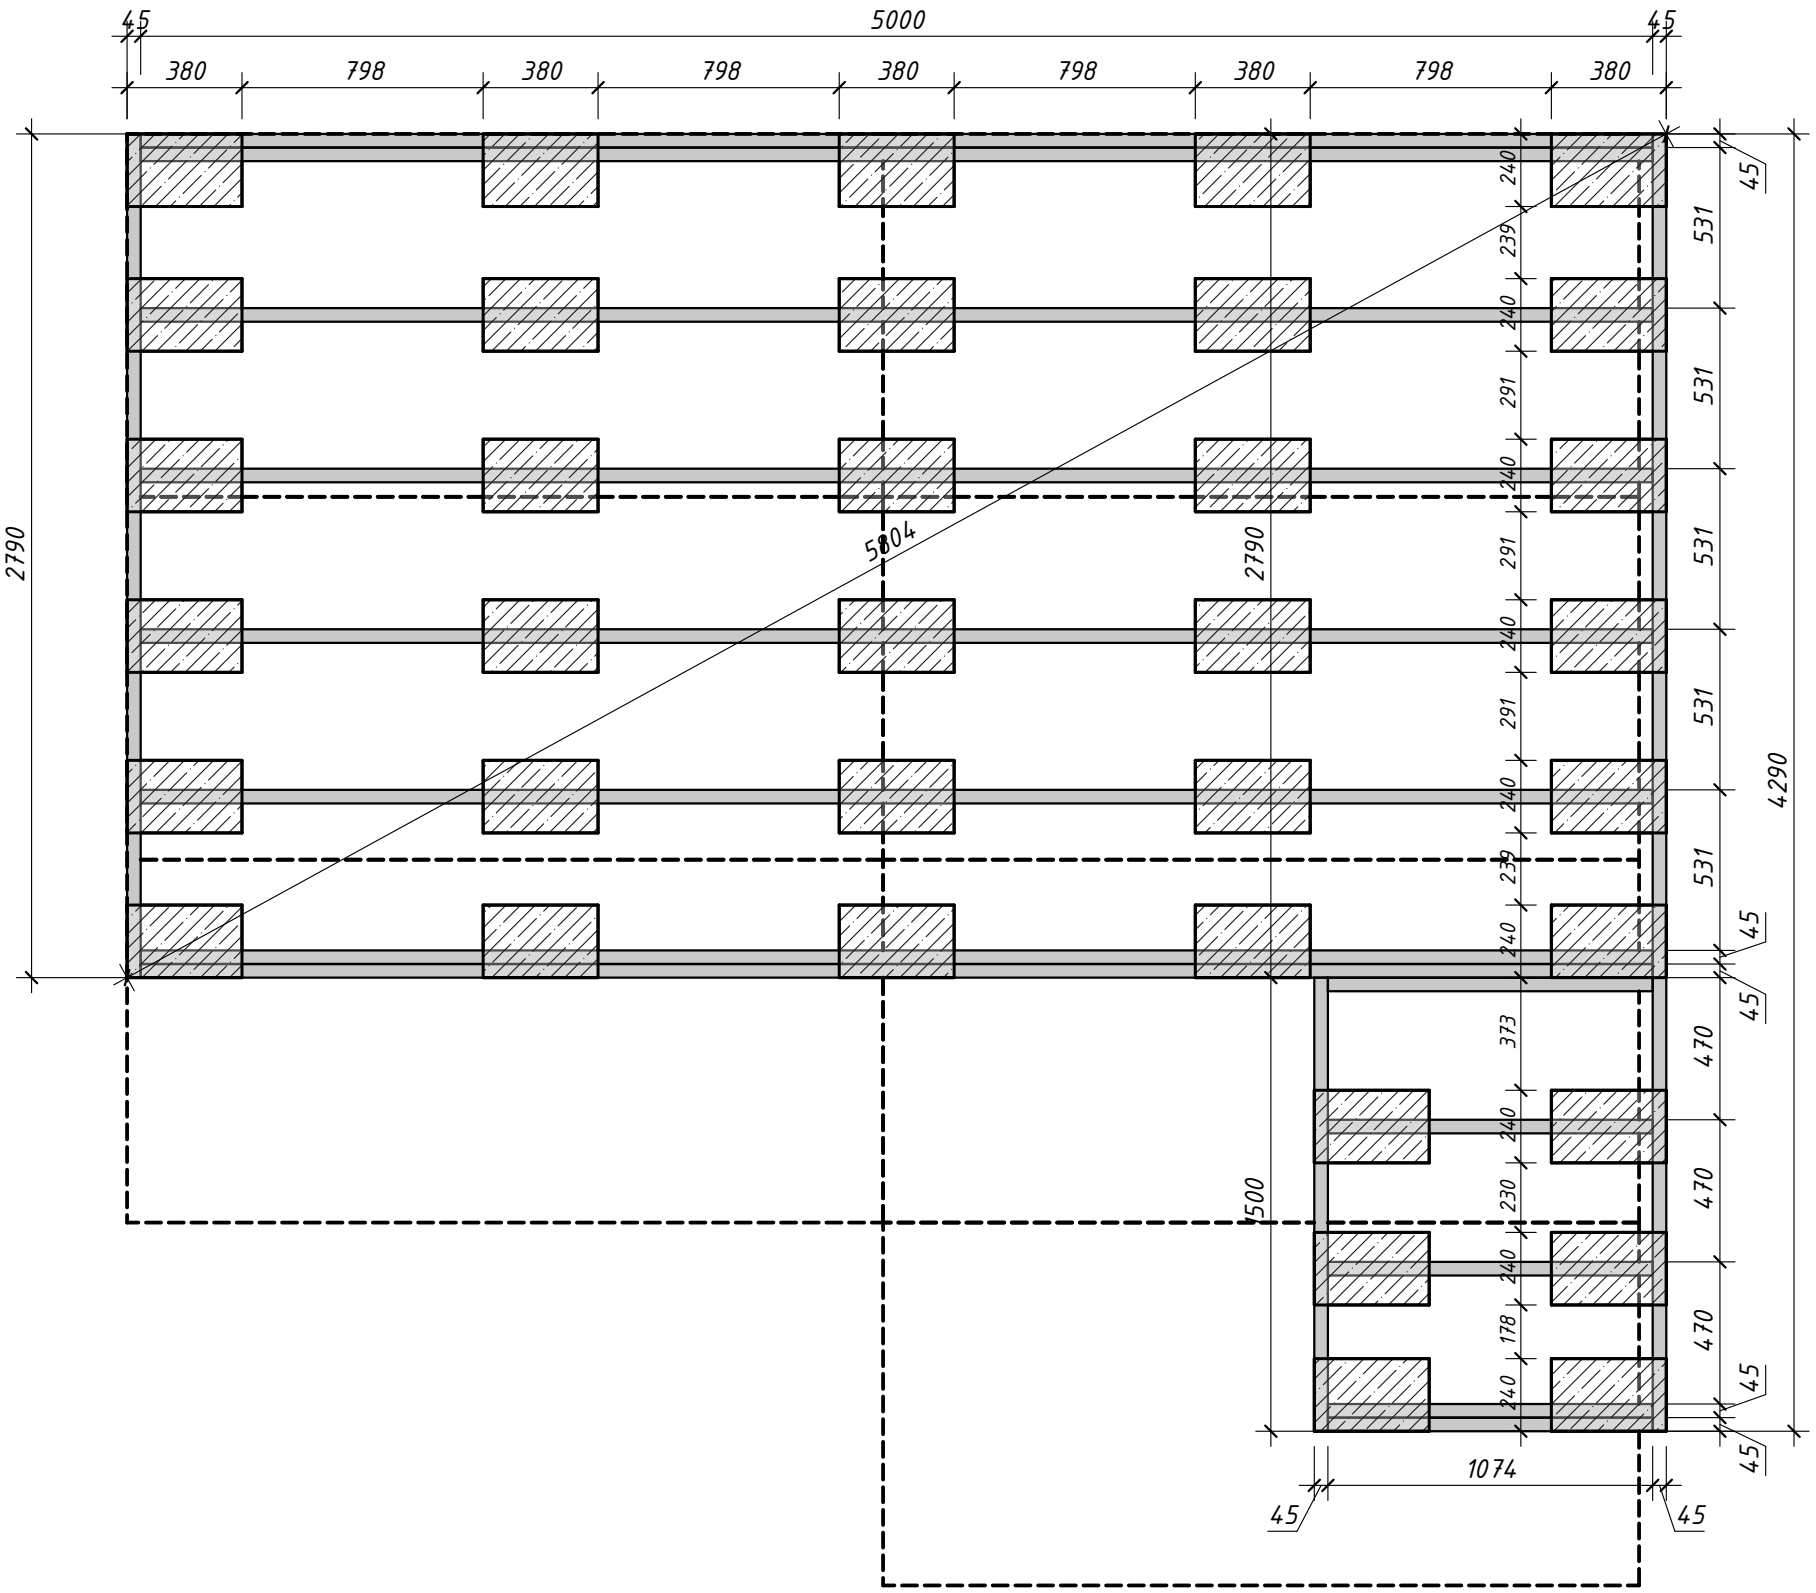

WYMAGANIA DOTYCZąCE PRZYGOTOWANIA FUNDAMENTU POD FUNDAMENT Z BLOCZKóW: (WYKONYWANE PRZEZ KLIENTA).

- Wykopać ok. 20–25 cm powierzchni wg schematu rozmieszczenia bloczków.
- Wsypać warstwę piachu około 7 cm– zagęścić zagęszczarką
- Położyć geowłókninę i przysypać ją kilkucentymetrową warstwą piachu
- Następnie wysypać kolejną warstwę piachu
- Wysypać tłuczeń o frakcji 0–31mm lub 16–31mm około 15cm (w zależności od głębokości wykopu)
- Zagęścić zagęszczarką.

OPIS I ZAKRES PRAC (WYKONUJE HORTON):

- Usunięcie darni i wykopanie miejsc pod bloczki (zgodnie z rysunkiem utożenia bloczków)
- Montaż bloczków na suchej zaprawie cementowej, wypoziomowanie ich w pionie
